



INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN3

2. RESULTADO DE AVANCE4

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.....4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 10

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 11

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 12

4. ANEXOS DIGITALES 12

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 12
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 12

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
4	12.09.2024	12.09.2024	23.09.2024

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al **31 de agosto del 2024**, de todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias para su gestión, en cinco (5) Etapas (*Figura 1*), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.

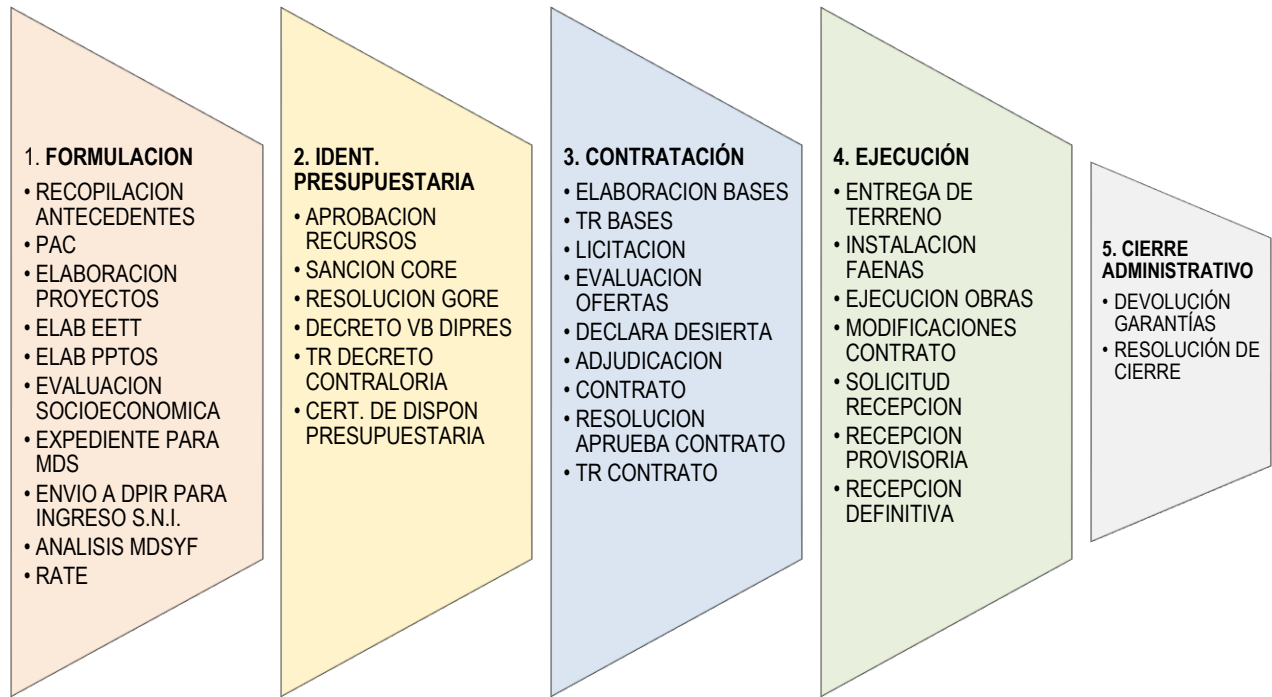

¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2. RESULTADO DE AVANCE

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
1	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	76%	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de Cauce en la DGA.
2	Primavera	1. Servicios Básicos	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	0%	Perfil Ingresado con FI, Aguas Magallanes (AMA) prepara respuesta de observaciones de MDSyF.	Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil corregido por Aguas Magallanes para el ingreso a evaluación MDSyF.
3	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	82%	86%	En Red Tercario se están terminando los trabajos de instalación de acometidas residenciales. Se trabaja en la elaboración de mandatos junto con Gasco y Asesores del Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.	Con fecha 11.7.2024 se remite a DPIR Memo (DIT) N° 113 solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluación del proyecto, incorporando obras adicionales y extraordinarias para atender las solicitudes recibidas para la incorporación de nuevos beneficiarios. Iniciativa se encuentra en revisión por parte del MDSyF de la reevaluación, declarada admisible el 22.8.2024.



N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
4	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	100%	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del 8.7.2024.	JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original. Pendiente formas de financiamiento.
5	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	100%	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 318 del 8.7.2024.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
6	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	0%	0%	Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía y Bases Administrativas en correcciones finales.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
7	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	0%	0%	Perfil terminado enviado a DPIR para evaluación. Solicitud de cotización adicional. En levantamiento de observaciones.	Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los equipos, la que aún se encuentra en proceso de formulación.
8	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	50%	43%	Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en proceso de elaboración por parte de la Empresa Eléctrica). Sector N°4: en proceso de ejecución de obras (a la fecha se considera un 15% de avance de las obras); el pago del subsidio de este sector se encuentra en procesos administrativos de facturación por parte de la empresa.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
9	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	31%	26%	En elaboración de las bases técnicas del "Diseño de red de abastecimiento de combustible de los estanques".	Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del nuevo diseño. Se estima que el proyecto signifique una reevaluación.
10	Porvenir	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	85%	90%	Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite, motivo por el que se ha tenido que aumentar el plazo de la etapa en 300 días corridos a través de ADENDA 7.	Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoría dependientes de la Seremi de

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
									Salud, institución donde se mantiene en revisión el PAS 141 (construcción relleno sanitario).
11	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	60%	36%	Se suspende plazo de ejecución de proyecto a la espera de propuesta técnica de parte del consultor para complementar levantamiento hidrológico e hidrogeológico en áreas críticas del proyecto, determinantes para la ingeniería de detalles.	Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.
12	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OTROS	79%	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.
13	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	ANALISIS MDSYF	0%	0%	Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024.	Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22,7,2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa, por lo que se espera la creación de asignación presupuestaria para poder licitar la adquisición.
14	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	28%	29%	En suspensión de plazo de Contrato correspondiente a los suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés - ítem N°2. No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA. Preparación de Bases para la Asesoría Técnica.	Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la redistribución de materiales en el área de

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
									almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).
15	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	54%	55%	Se encuentra en ejecución el contrato de mano de obra de cubiertas de plaza de juegos (C8). Mediante Resolución Ex. (G.R.) N° 374 de 12.08.2024 se aprueba término anticipado de contrato (C7) de suministros de madera para cubiertas. Se determina efectuar un nuevo proceso de licitación.	Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una pronta entrega de materiales (C7). Múltiples licitaciones para completar la obra.
16	Laguna Blanca	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	100%	100%	La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
17	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	100%	100%	Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año con término en noviembre de 2024.	Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el pago que le significó asumir intereses de factoring, los que mediante carta se encuentra cobrando al GORE. Mediante Of. Ord. (DPIR) N°497 de 17.04.2024, informa sobre reclamación de pago, puesto que no procede acoger la reclamación planteada.
18	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado ante Notario. Se ingresa Resolución TR 44 que Aprueba	Publicación de la Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO lo


N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
								Convenio reingresada a Contraloría para Toma de Razón con fecha 28.6.2024 con Adenda N° 1 que corrige aspectos observados en primera presentación.	que se hace el 19.8.2024. A la espera que DPIR ingrese al CORE solicitud de modificación presupuestaria de recursos del St. 31 al St. 33 según modificación legal.
19	Natales	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	100%	100%	Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestión de entrega de boletas de garantías.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
20	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	0%	0%	Iniciativa ingresada a MDS para su evaluación técnico económica. A la espera de rate.	Baja capacidad de formulación AMA.
21	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	Se reevalúa proyecto, se obtiene rate RS y CORE aprueba incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingeniería.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
22	Natales	3. Otros - Estudios	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	0%	En elaboración de Consulta de Pertinencia para ingreso a evaluación al SEA	Reuniones con Min. Energía y otros servicios para la factibilidad técnica del proyecto
23	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	En elaboración de documento "Adenda N°1", para posterior protocolización y entrega de terreno para ejecución de obras. Una vez realizada la entrega de terreno la empresa cuenta con 120 días corridos para la ejecución de las obras.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
24	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL	4. EJECUCIÓN	OTROS	63%	63%	Licitaciones de adquisición de instrumentos y equipos para la Unidad Técnica DIT. Adjudicada parcialmente licitación 1609-13-LE23. Adjudicada licitación 1609-25-LE23. Memo (DPIR) N°66 de 15.02.2024, informa reevaluación del proyecto sin observaciones, por un valor de M\$ 52.113. Tercer llamado ID 1609-18-	No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin embargo, se encuentra pendiente la licitación de equipos informáticos. Dificultades para obtener ofertas de equipos con las características requeridas. Escasos proveedores que trabajen con Mercado Público. Última licitación de agosto se declaró

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
								LE24 se declara desierta sin ofertas recibidas.	desierta, por publicar un nuevo llamado.
25	Punta Arenas	3. Otros - Programas	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	En revisión del Convenio de Transferencia por parte de la UMAG.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
26	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	0%	0%	De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de redes eléctricas y financiados con recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa de extensión de red sector sur. En recopilación de nuevos beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa eléctrica EDELMAG.	Iniciativa deberá esperar resultado de gestiones con Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones que podrían factibilizar el proyecto.
27	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	0%	Se encuentra en proceso de licitación. Se retrotrae y revoca licitación, mediante resolución Ex. (GR) N°375 y N°376 de fecha 13,08,2024, respectivamente. Se encuentra en proceso de licitación 2do. llamado, desde el 28,08,2024 a través de ID 1609-21-LE24	No se presentan nudos críticos a la fecha del presente reporte.
28	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	0%	0%	Resolución T.R. N°58 fue ingresada a Contraloría el 14.8.2024, para toma de razón.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.


En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **veintiocho (28) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas

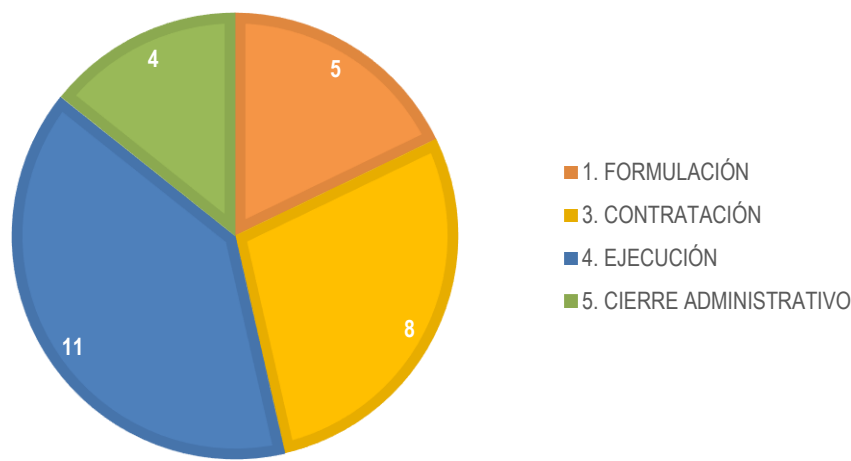

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de éstas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna

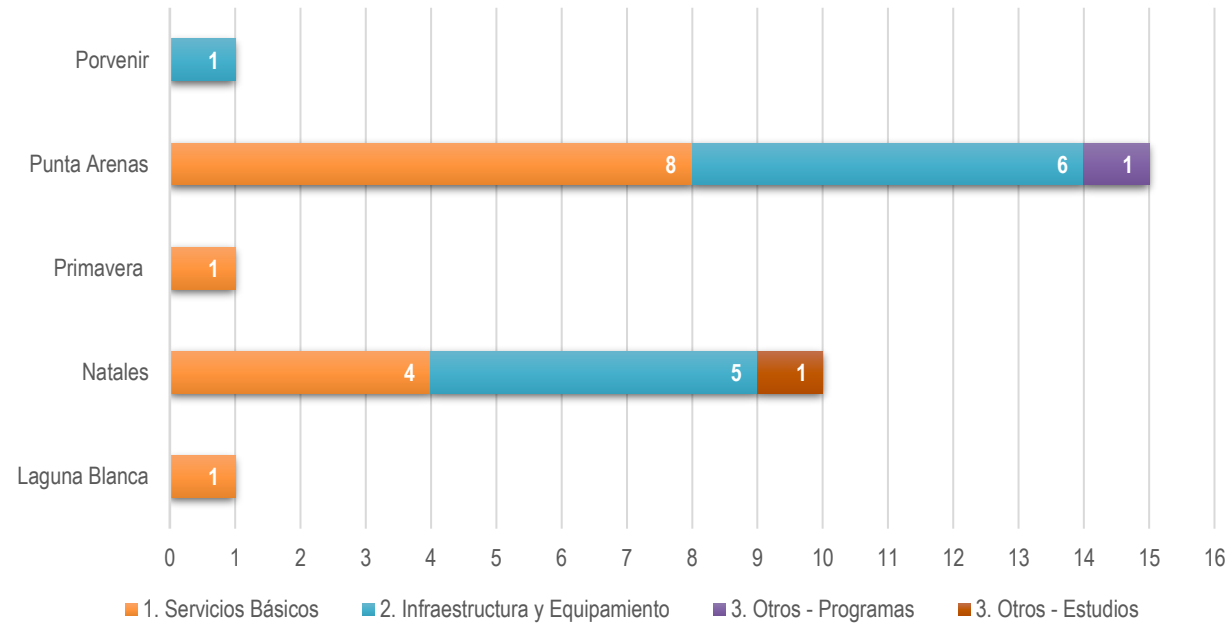

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico para iniciativas en etapa de ejecución es de un **71%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas en etapa de ejecución es de un **70%**. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT



En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus nudos y gestiones.

En conclusión, el estado de avance es el siguiente:

CANTIDAD DE INICIATIVAS	NUDOS Y GESTIONES	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	PORCENTAJE FÍSICO (EJECUCIÓN)	PORCENTAJE FINANCIERO (EJECUCIÓN)
28	18	11	71 %	70%

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulación, Contratación, Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de M\$ 21.231.337, las que se encuentran en distintas etapas de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los M\$ 5.482.106, con una ejecución financiera a la fecha de **M\$ 4.465.442**.

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)
