



# INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

## UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 3

2. RESULTADO DE AVANCE ..... 4

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL ..... 4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. .... 9

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN ..... 9

2.4. HITOS RELEVANTES..... 10

2.5. NUDOS CRÍTICOS ..... 10

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS ..... 11

4. ANEXOS DIGITALES ..... 11

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) ..... 11
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) ..... 11

| N° INFORME | ELABORADO  | APROBADO   | PUBLICADO |
|------------|------------|------------|-----------|
| 9          | 13.10.2025 | 21.10.2025 |           |

# INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

## UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

### 1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 30 de septiembre de 2025 de las iniciativas de inversión pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica<sup>1</sup> y/o División Técnica<sup>2</sup>.

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.
- Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública en cinco (5) etapas (Figura 1), que comprenden una serie de hitos de avance con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa y legal, así como coordinaciones interinstitucionales necesarias para su materialización. Adicionalmente, y considerando situaciones actuales que requieren un seguimiento más preciso del ciclo de las iniciativas, se incorpora de manera complementaria la Etapa 6: “Transferido”, destinada a identificar aquellas iniciativas que, habiendo cumplido su fase de formulación y/o ejecución bajo responsabilidad de la División, han sido formalmente traspasadas a otra entidad para su continuidad. Esta incorporación no modifica la estructura de seguimiento utilizada en informes anteriores, sino que la complementa con el fin de reflejar con mayor precisión el estado real de la cartera y facilitar la trazabilidad de las iniciativas.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.

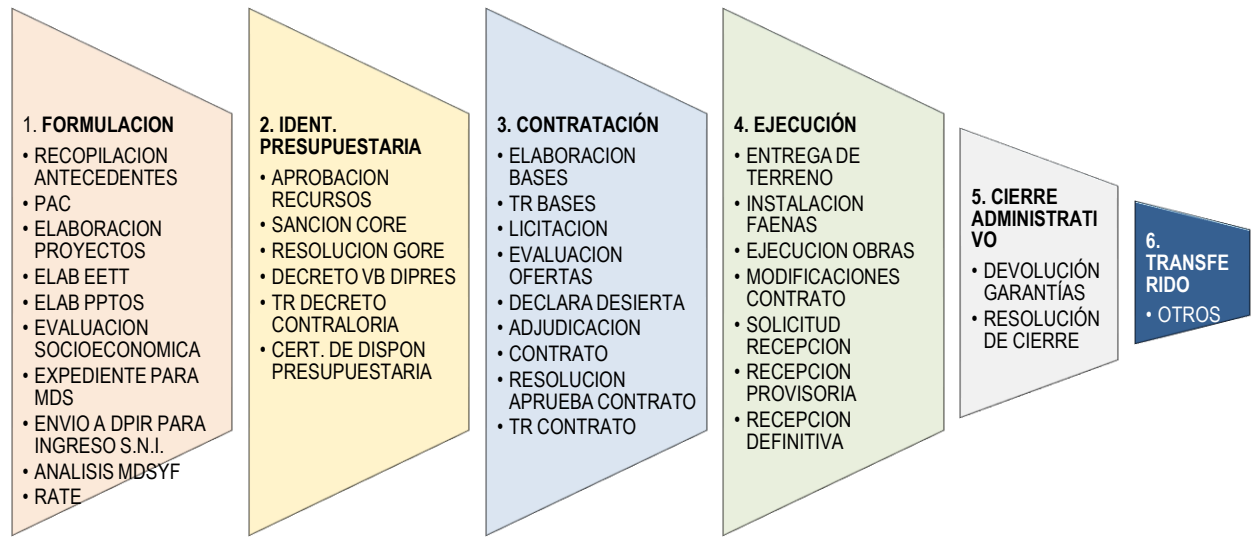

<sup>1</sup> Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

<sup>2</sup> División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2.

RESULTADO DE AVANCE

2.1.

ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

| N° | COMUNA       | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | NOMBRE DE LA INICIATIVA  | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO   | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRAT O (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | PUNTA ARENAS | Saneamiento     | Diseño       | CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS              | EJECUCIÓN    | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 76%             | Con fecha 30.09.2025 la DGA aprobó de la Modificación de los Causas de los Ríos Leñadura y de los Ciervos.   | Na   | 286.877                     | 207.125            | 72%                 |
| 2  | PRIMAVERA    | Saneamiento     | Diseño       | HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO | CONTRATACIÓN | LICITACION                   | RS          | 0%              | Se encuentra en proceso de Licitación, se amplió plazo hasta el 13.10.2025 para la recepción de ofertas.   | Na   | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 3  | PUNTA ARENAS | Gas Natural     | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS                              | EJECUCIÓN    | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 90%             | Se están ejecutando las obras.   | Na   | 3.671.256                   | 3.671.256          | 100%                |
| 4  | NATALES      | Electrificación | Ejecución    | REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES                               | CONTRATACIÓN | TR BASES                     | RATE DPIR   | 0%              | Con fecha 22.09.2025, Contraloría Toma Razón de Bases de licitación. Las bases se enviaron a DAF para iniciar proceso de licitación.   | Na   | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 5  | NATALES      | Electrificación | Ejecución    | REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN                                     | CONTRATACIÓN | OTROS                        | RATE DPIR   | 0%              | Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, para avanzar en la adquisición de los equipos generadores, se debe habilitar la plataforma en la que se instalarán.  | Na   | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 6  | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS          | EJECUCIÓN    | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 75%             | Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atravesos. | Na   | 157.842                     | 144.672            | 92%                 |

| N° | COMUNA       | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | NOMBRE DE LA INICIATIVA  | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO  | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 7  | NATALES      | Infraestructura | Ejecución    | REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN          | EJECUCIÓN    | MODIFICACIONES CONTRATO      | RS          | 31%             | Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.  | Na   | 93.116                     | 93.116             | 100%                |
| 8  | PORVENIR     | Infraestructura | Diseño       | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO                       | EJECUCIÓN    | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 98%             | En preparación de antecedentes para ingreso del Expediente del Proyecto en Etapa Ejecución a MDSF.  | Na   | 423.394                    | 413.797            | 98%                 |
| 9  | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Diseño       | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES                                | EJECUCIÓN    | MODIFICACIONES CONTRATO      | RS          | 40%             | El contrato se mantiene suspendido mientras se realizan consultas a sectores respecto de los Permisos Ambientales Sectoriales mixtos exigidos por la RCA.   | Na   | 457.781                    | 164.783            | 36%                 |
| 10 | NATALES      | Equipamiento    | Ejecución    | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN | TRANSFERIDO  | OTROS                        | RATE DPIR   | 79%             | Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con los recursos pendientes para la habilitación.  | Na.  | 113.757                    | 95.574             | 84%                 |
| 11 | NATALES      | Equipamiento    | Ejecución    | ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN           | TRANSFERIDO  | OTROS                        | RATE DPIR   | 0%              | Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR.  | Na.  | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 12 | NATALES      | Infraestructura | Ejecución    | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN                                 | FORMULACIÓN  | REEVALUACIÓN INICIATIVA      | RS          | 69%             | Se encuentran los contratos de mano de obra suspendidos, dado que se encuentra en proceso de formulación plan de manejo forestal y adquisición de suministro de madera complementario. Se mantienen regularmente estados de pago de AITO Contratos, Arriendo Área Almacenamiento, Servicios de Bodeguero. | Na   | 1.251.097                  | 740.512            | 59%                 |
| 13 | NATALES      | Infraestructura | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN                                      | EJECUCIÓN    | RECEPCION DEFINITIVA         | RS          | 100%            | La obra se encuentra con Recepción de Obras totales y gestionando último estado de pago.  | Na   | 296.748                    | 285.960            | 96%                 |

| N° | COMUNA       | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | NOMBRE DE LA INICIATIVA  | ETAPA ACTUAL          | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO   | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS        | MONTO TOTAL CONTRAT O (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|--------------|-----------------|--------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|--|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 14 | NATALES      | Infraestructura | Ejecución    | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN                          | CIERRE ADMINISTRATIVO | OPERACIÓN                    | RATE DPIR   | 100%            | Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024.   | Na  | 93.999                      | 93.999             | 100%                |
| 15 | PUNTA ARENAS | Gas Natural     | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS                  | CONTRATACIÓN          | RESOLUCION APRUEBA CONTRATO  | RS          | 0%              | 'Se obtiene la aprobación técnica del Ministerio de Energía. Posteriormente se ingresará a Contraloría Regional para Toma Razón.   | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 16 | PUNTA ARENAS | Saneamiento     | Ejecución    | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS                  | FORMULACIÓN           | EXPEDIENTE PARA MDS          | FI          | 0%              | Iniciativa se dividió en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; Pje. La Picada pronto a ingresar a MDSF en nivel 0 y se proseguirá con Prol. Av. Martinez de Aldunate y posteriormente con Pje Esperanza. DIT realizará todo el trámite de formulación.              | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 17 | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Diseño       | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS                 | EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 42%             | La UT ya firmó la adenda con la Consultora en la cual se amplía el plazo. Durante octubre se emitirá Resolución que aprueba dicha adenda. Consultora amplió Boleta de Garantía.  | Situación de terrenos a despejar durante el mes de octubre. | 316.193                     | 119.931            | 38%                 |
| 18 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS | CIERRE ADMINISTRATIVO | RESOLUCIÓN DE CIERRE         | RS          | 100%            | Obras finalizadas en marzo 2025.   | Na  | 109.790                     | 109.790            | 100%                |
| 19 | PUNTA ARENAS | Otros           | Ejecución    | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS                     | DESESTIMADO           | OTROS                        | RATE DPIR   | 0%              | El Programa no fue priorizado, por lo que se desestima iniciativa.   | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 20 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS                       | FORMULACIÓN           | ELABORACIÓN PROYECTOS        | Sin RATE    | 0%              | En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está realizado. Esta iniciativa se denominará ahora: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0 | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |

| N° | COMUNA       | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | NOMBRE DE LA INICIATIVA   | ETAPA ACTUAL          | HITO DE AVANCE            | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO  | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS  | MONTO TOTAL CONTRAT O (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|--------------|-----------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 21 | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Ejecución    | CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS              | CIERRE ADMINISTRATIVO | RECEPCION PROVISORIA      | RATE DPIR   | 100%            | Durante el periodo de garantía de buena ejecución de obra, se evidencian observaciones las cuales se encuentran en proceso de reparación por parte del contratista.   | Na  | 111.257                     | 111.257            | 100%                |
| 22 | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Ejecución    | HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS | CONTRATACIÓN          | TR CONTRATO               | RATE DPIR   | 0%              | La Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025.  | En trámite la obtención del Permiso de Democión Parcial que se estima iniciará a principios de octubre la entrega de terreno e inicio de obras. | 5.052.386                   | 0                  | 0%                  |
| 23 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBEDAL, PUNTA ARENAS                           | FORMULACIÓN           | RECOPILACION ANTECEDENTES | Sin RATE    | 0%              | Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).   | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 24 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS                  | FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS     | Sin RATE    | 0%              | Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social  | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 25 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS                    | FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS     | Sin RATE    | 0%              | Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).   | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 26 | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS                      | FORMULACIÓN           | ELAB EETT                 | Sin RATE    | 0%              | Se elaboraron y compilaron los antecedentes necesarios para la tramitación del comodato del terreno, el cual será solicitado por parte de la UNCO al SERVIU, gestionando la extensión de plazo a 20 años. La carpeta será entregada a la directiva para su gestión final el mes de octubre. | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |
| 27 | PUNTA ARENAS | Infraestructura | Ejecución    | REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS             | CONTRATACIÓN          | LICITACION                | RATE DPIR   | 0%              | Reevaluación de la iniciativa fue positiva y se ingresará al Core en sesión del 15.10.2025.   | Na  | 0                           | 0                  | 0%                  |






DIVISIÓN  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES  
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

| N° | COMUNA       | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | NOMBRE DE LA INICIATIVA  | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO  | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATADO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|---|--|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 28 | PUNTA ARENAS | Saneamiento     | Ejecución    | PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS               | EJECUCIÓN    | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RATE DPIR   | 21%             | Se acuerda elaborar una adenda para aumento de cobertura y la segunda campaña iniciará la segunda semana de octubre.  | Na   | 270.000                      | 57.828             | 21%                 |
| 29 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS              | FORMULACIÓN  | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | 0%              | A la espera de la recepción de presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivación de antecedentes a Desarrollo Social   | Na   | 0                            | 0                  | 0%                  |
| 30 | PUNTA ARENAS | Electrificación | Ejecución    | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN  | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | 0%              | Presupuesto en trámite de aprobación por parte de la empresa eléctrica.   | Na   | 0                            | 0                  | 0%                  |
| 31 | NATALES      | Portuario       | Ejecución    | MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA                | TRANSFERIDO  | OTROS                        | Sin RATE    | 0%              | La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el SEA. | Na   | 0                            | 0                  | 0%                  |




2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **treinta y una (31) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:

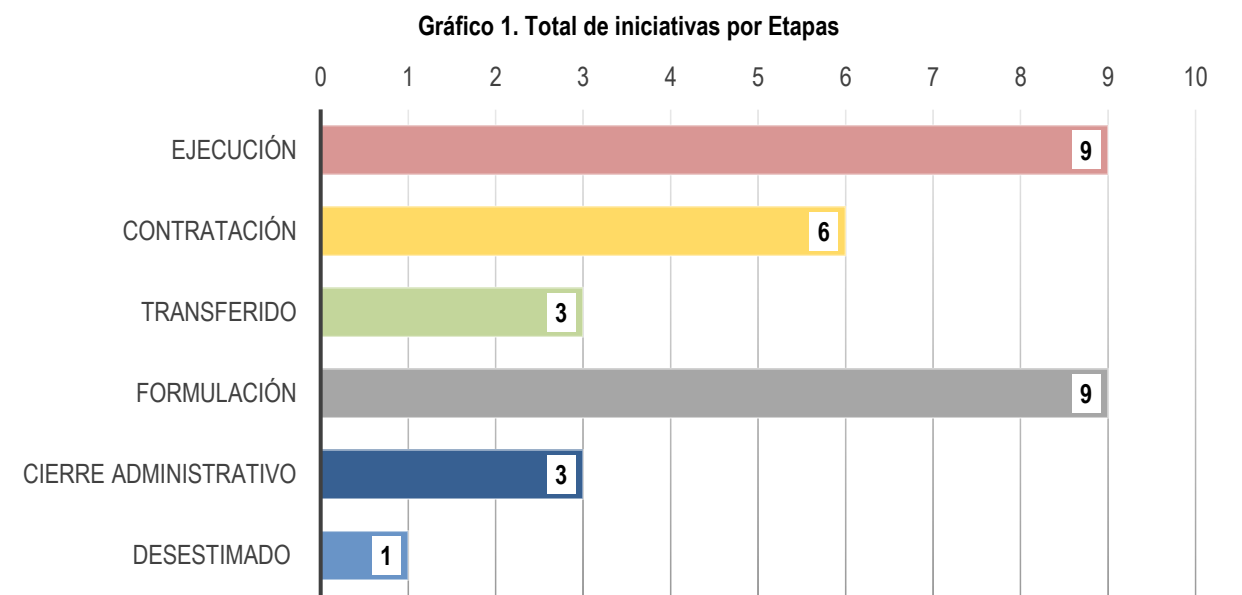

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:

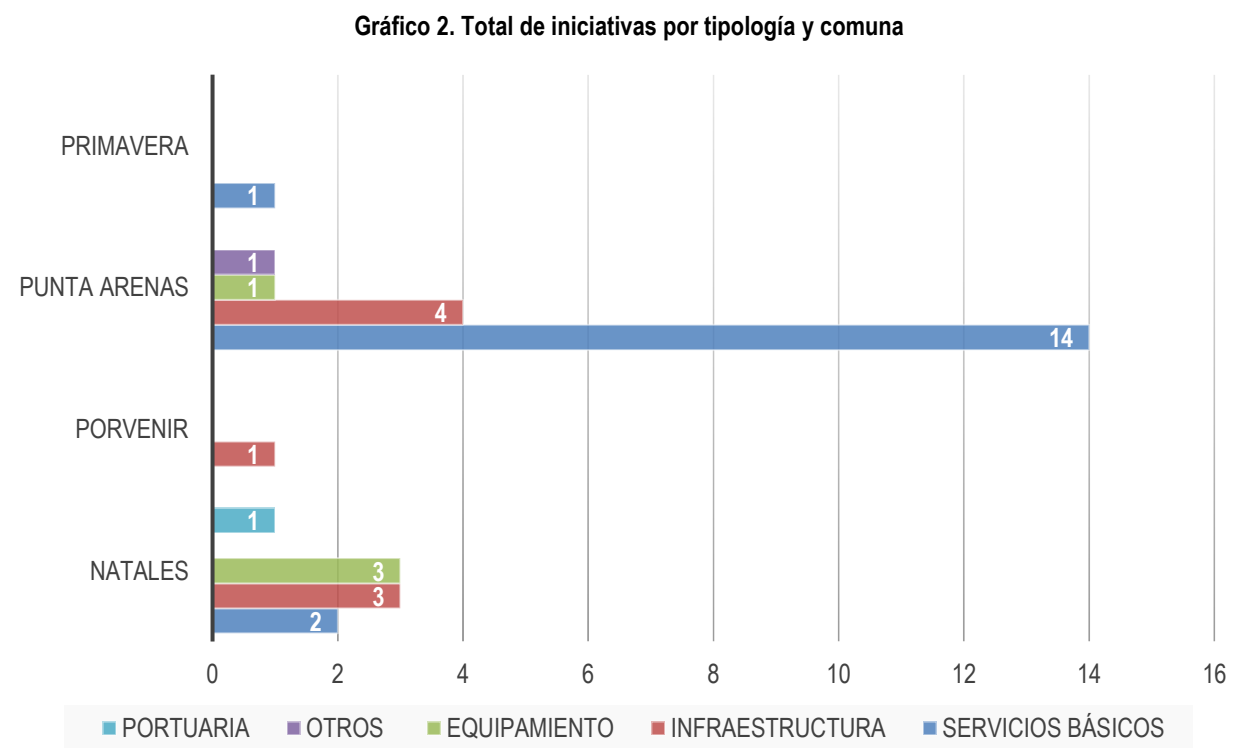


En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico de las Iniciativas en Etapa de Ejecución es de un **63%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero es de un **73%**. El detalle se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT

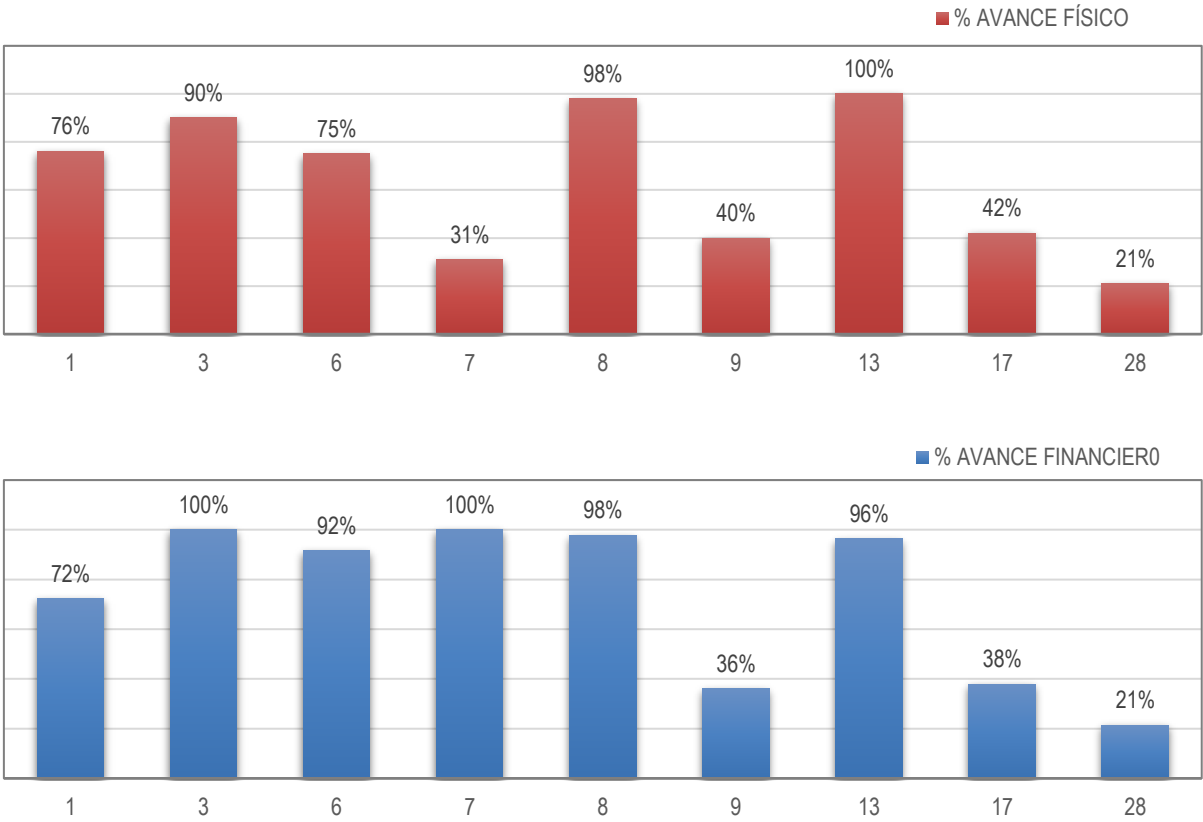

| N° | NOMBRE DE LA INICIATIVA   |
|----|---|
| 1  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS       |
| 3  | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS                       |
| 6  | CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS   |
| 7  | REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN |
| 8  | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO              |
| 9  | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES                       |
| 13 | CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN                             |
| 17 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS    |
| 28 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS                    |

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.4. HITOS RELEVANTES

Gestiones con el Municipio de Natales y otros Servicios (SLEP, DOH, etc.), para la ejecución de iniciativas del Plan de Desarrollo Puerto Edén.

2.5. NUDOS CRÍTICOS

Los principales nudos son identificar mecanismos para reactivar la operación del Wifi de Puerto Edén y obtención de permisos sectoriales para iniciativas.



### 3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, principales nudos críticos y gestiones asociadas.

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

| Cantidad total de iniciativas en proceso | Con nudos y gestiones | Iniciativas con Avance físico / financiero | Avance físico promedio | Avance financiero promedio |
|--|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|
| 31                                       | 3                     | 9  | 63 %                   | 73%                        |

La cartera total alcanza un monto estimado de M\$ 45.431.996. Los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución) suman M\$ 12.705.493, con pagos acumulados por M\$ 6.309.600

### 4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)
